



平成29年10月現在、現場各所で以下のように工事が進んでいます。

【国分7丁目付近】 場内で国道、側道の新設工事や通水対策工を進めています。また雨水函渠工を進めています。

【国分6丁目付近】 国道や側道の新設工を中心に場内各所で通水対策工、歩道橋下部工、雨水函渠工を進めています。11月以降エリア内で調整池を造成します。

【国分1丁目付近】 国分交差点部の盤下げを夜間工事で実施しています。また国道や側道の新設工、歩道橋下部工、雨水函渠工を進めています。

今後も細心の注意を払って工事を進めてまいりますので、ご理解ご協力のほどお願いいたします。


【H29年10月中旬～H29年11月の工程表(予定)】

Table with columns for construction work (e.g., 通水対策工, 国道新設工) and a grid for dates from October to November 2017, indicating planned work days with red and blue shading.

※休日は仮囲い、道路・排水補修など場内整備、機械整備などの作業を行う場合があります。なお迂回道路工等により通行止め他を行う場合は、別途近隣の方にご案内申し上げます。

【10月の施工状況(10/15現在)】

事業用地内各所で主に以下のように工事を進めています。下記の見取り図と写真をご参照下さい。

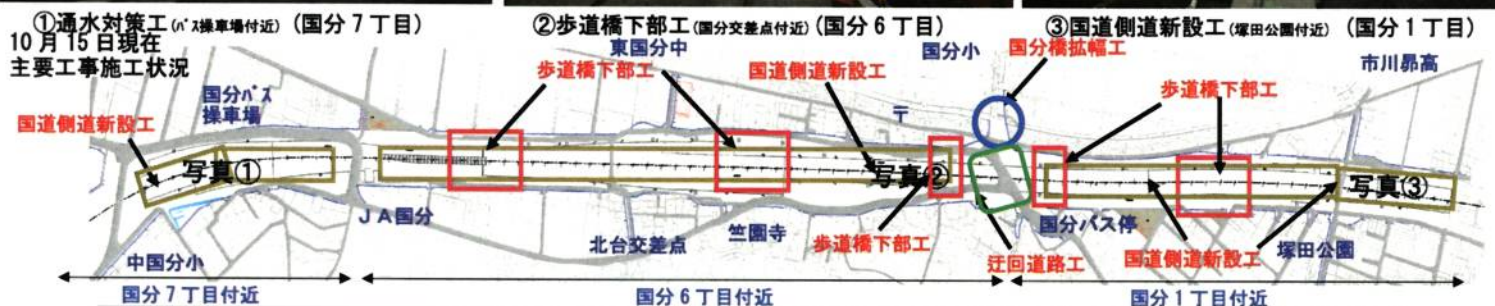

お問い合わせ先

■鹿島建設(株)・株大林組特定建設工事共同企業体

東京外環自動車道 国分工事事務所 TEL: 047-300-7080 (9:00~17:30)
