千葉外環　国分地区の工事状況のお知らせ

平成２９年９月

平成 29 年 9 月現在、現場各所で以下のように工事が進んでいます。

【国分７丁目付近】　場内で国道新設や通水対策工を進めています。国道新設にあわせて側道部分の新設や雨水函渠工事を進めていきます。

【国分 6 丁目付近】　場内各所で通水対策工、歩道橋下部工、雨水函渠工を進めています。国道新設のための路盤整備や排水工事も実施しています。

【国分 1 丁目付近】　9 月下旬頃より国分交差点部の盤下げを夜間工事で実施します。また場内では国道新設工、歩道橋下部工、雨水函渠工、側道新設工を進めていきます。

今後も細心の注意を払って工事を進めてまいりますので、ご理解ご協力のほどお願いいたします。

【H29 年 9 月中旬～H29 年 10 月の工程表(予定)】

施工工種	作業内容	平成29年9月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	平成29年10月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
		土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土	日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火
通水対策工	連壁の一部を撤去し地下水の通り道を確保します。		
	・現場各所で集水及び復水の井戸を設置		
国道新設工	国道298号の新設工事を行います。		
	・国道部分の測量、排水設備、路盤整備、舗装		
側道新設工	国道298号の側道部分の工事を行います。		
	・側道部分の測量、排水設備、路盤整備、舗装		
歩道橋下部工	歩道橋となる箇所に杭を打設し基礎を造成します。		
	・歩道橋の下部の杭打設と基礎造成		
迂回道路工	作業ヤードを確保するため、道路の切り替えを行います。		
	・既設道路の撤去、盤下げと道路の新設		
雨水函渠工	現場内外の雨水排水函渠を整備します。		
	・現場内外の雨水函渠路の撤去と新設		
国分橋拡幅工	国分橋を拡幅するための工事を行ないます。		
	・橋台躯体工　護岸復旧工・拡幅工		
仮設工	工事に伴う養生や井戸掘削、設備工事を行います。		
	・場内仮囲い整備、道路補修、井戸掘削、管敷設		

※休日は仮囲い、道路・排水補修など場内整備、機械整備などの作業を行う場合があります。なお迂回道路工等により通行止め他を行う場合は、別途近隣の方にご案内申し上げます。

【9 月の施工状況(9/15 現在)】

事業用地内各所で主に以下のように工事を進めています。下記の見取り図と写真をご参照下さい。

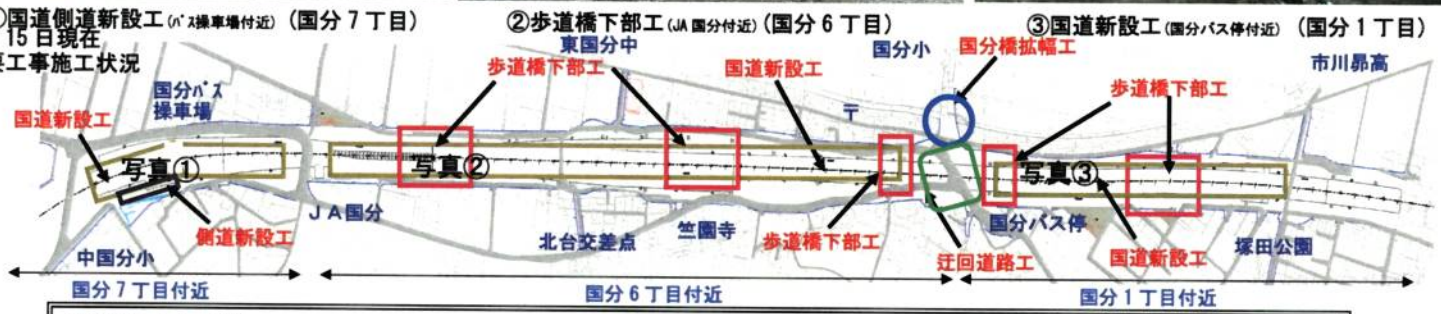

お問い合わせ先

■鹿島建設㈱・㈱大林組特定建設工事共同企業体

東京外環自動車道　国分工事事務所　　ＴＥＬ：０４７－３００－７０８０(9:00～17:30)
