千葉外環　国分地区の工事状況のお知らせ

平成３０年４月

平成 30 年 4 月現在、現場各所で以下のように工事が進んでいます。

【国分 7 丁目付近】　場内外で国道、側道の新設工事や雨水函渠の整備を進めています。また 4 月上旬より調整池の築造も実施しています。

【国分 6 丁目付近】　道の駅周辺の道路供用が一部開始され、また調整池の工事は一時完了しています。場内外で国道、側道の整備を中心に進めていきます。

【国分 1 丁目付近】　引き続き国分交差点部の県道整備を夜間工事で実施しています。各所で側道新設工を進めていきます。次の道路切り替えは 6 月 2 日の外環開通時となります。

今後も細心の注意を払って工事を進めてまいりますので、ご理解ご協力のほどお願いいたします。

【H30 年 4 月中旬～H30 年 5 月の工程表(予定)】

施工工種	作業内容	平成30年4月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月	平成30年5月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木
通水対策工	連壁の一部を撤去し地下水の通り道を確保します。	完了	
	・現場各所で集水及び復水の井戸を設置		
国道新設工	国道298号の新設工事を行います。		
	・国道部分の測量、排水設備、路盤整備、舗装		
側道新設工	国道298号の側道部分の工事を行います。		
	・側道部分の測量、排水設備、路盤整備、舗装		
迂回道路工	既設道路の切り替えと整備を行います。		
県道整備工	・既設道路の撤去、盤下げ、排水整備と道路の新設		
雨水函渠工	現場内外の雨水排水函渠を整備します。		
	・現場内外の雨水函渠路の撤去と新設		
調整池造成工	雨水を一時的に貯める調整池を造成します。		
	・調整池設置個所の掘削、コンクリート打設		
国分橋補強工	国分橋を拡幅補強するための工事を行ないます。		
	・既設橋補強　護岸復旧工・拡幅工		
仮設工	工事に伴う養生や井戸掘削、設備工事を行います。		
	・場内仮囲い整備、道路補修、井戸掘削、管敷設		

※休日は仮囲い、道路・排水補修など場内整備、機械整備、側道新設などの作業を行う場合があります。なお迂回道路工等により通行止め他を行う場合は、別途近隣の方にご案内申し上げます。

【4 月の施工状況(4/15 現在)】

事業用地内各所で主に以下のように工事を進めています。下記の見取り図と写真をご参照下さい。

①国道側道新設工(ﾊﾞｽ操車場付近)（国分 7 丁目）　②国道新設工(竺圓寺付近高速入口)(国分 6 丁目)　③国道側道新設工（国分 1 丁目）

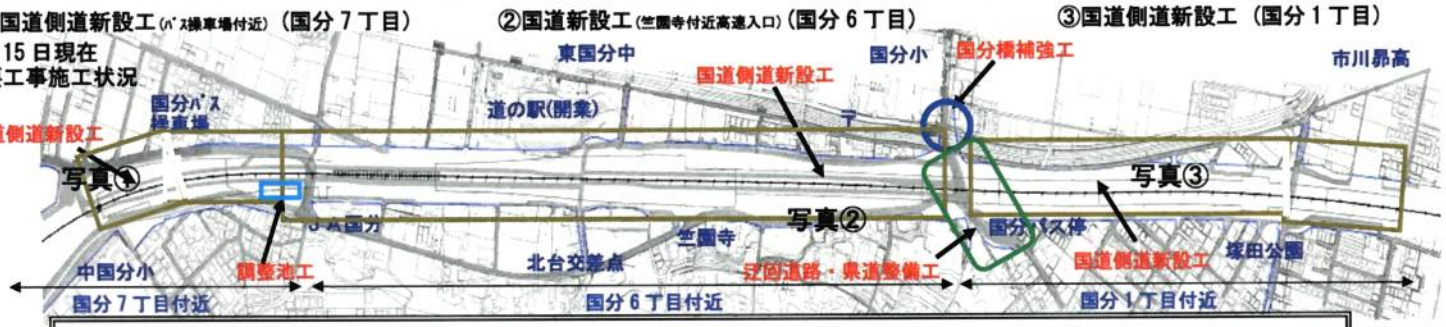

お問い合わせ先

■鹿島建設㈱・㈱大林組特定建設工事共同企業体

東京外環自動車道　国分工事事務所　　ＴＥＬ：０４７－３００－７０８０(9:00～17:30)
